

OPERATION LE SYRACUSE

Adresse : 13-15-17, avenue Mirabeau – 06600 Antibes (FR)
Type d'opération : Construction d'un immeuble à usage d'habitation (R+5 R - 3)
Lot : Paroi de soutènement provisoire butonnée en technique CSM


Période des travaux : Novembre 2011 à Juin 2012

INTERVENANTS

Maître d'Ouvrage : SARL MIRABEU c/o FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION
Maître d'œuvre : BET OCTOBON
Bureau de contrôle : QUALICONSLT
BET géotechnique : IMSRN Agence Alpes du Sud

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Etude d'exécution (notes de calcul et plans d'exécution)
- 77 panneaux CSM (implantation, foration, évacuation des déblais, mise en place des armatures,...)
- 2 niveaux de butonnage (liernes de répartition, tubes métalliques,...)
- Contrôle de qualité (enregistrement des paramètres de forage, essais de compression simple,...)
- Application de la méthode observationnelle (cibles topographiques, inclinomètres, piézomètres,...)
- Dossier de récolement (DOE)

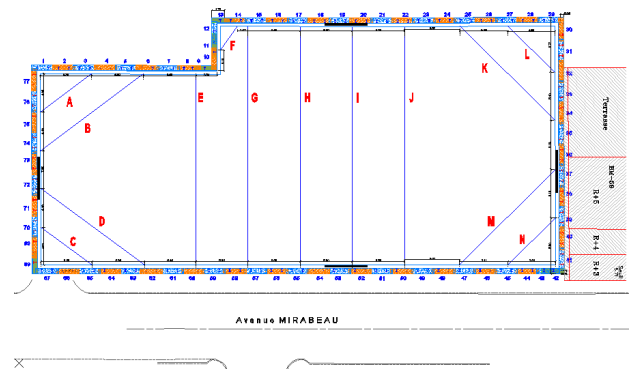

Travaux de perforation



Travaux de terrassement et butonnage
